

## 工事請負変更契約 報告書（都市建設部 農業土木課）


経済建設委員会資料  
令和8年6月23日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	現契約工期
1	白門井堰改良事業	白門井堰(仮設工)改良工事	有限会社 豊 進建設	84,337,000円	5,776,100円	78,560,900円	—	着 手 令和 7年 9月27日
				うち消費税	うち消費税	うち消費税	90.85%	
				7,667,000円	525,100円	7,141,900円	—	しゅん工 令和 8年 5月29日

### ※主な変更理由


本工事で使用した河川管理用道路の破損状況等について遠賀川河川事務所と補修範囲の協議を行った結果、アスファルト舗装の補修面積を400m<sup>2</sup>から1,080m<sup>2</sup>に変更したことによる増(2,620,000円)。また、仮設道路の幅員を別契約の白門井堰改良工事の受注者と協議を行った結果、一部区間の幅員を3.0mから4.0mに変更したことによる増(2,570,000円)。その他、各工種精査(586,100円)による変更。

白門井堰（仮設工）改良工事 位置図

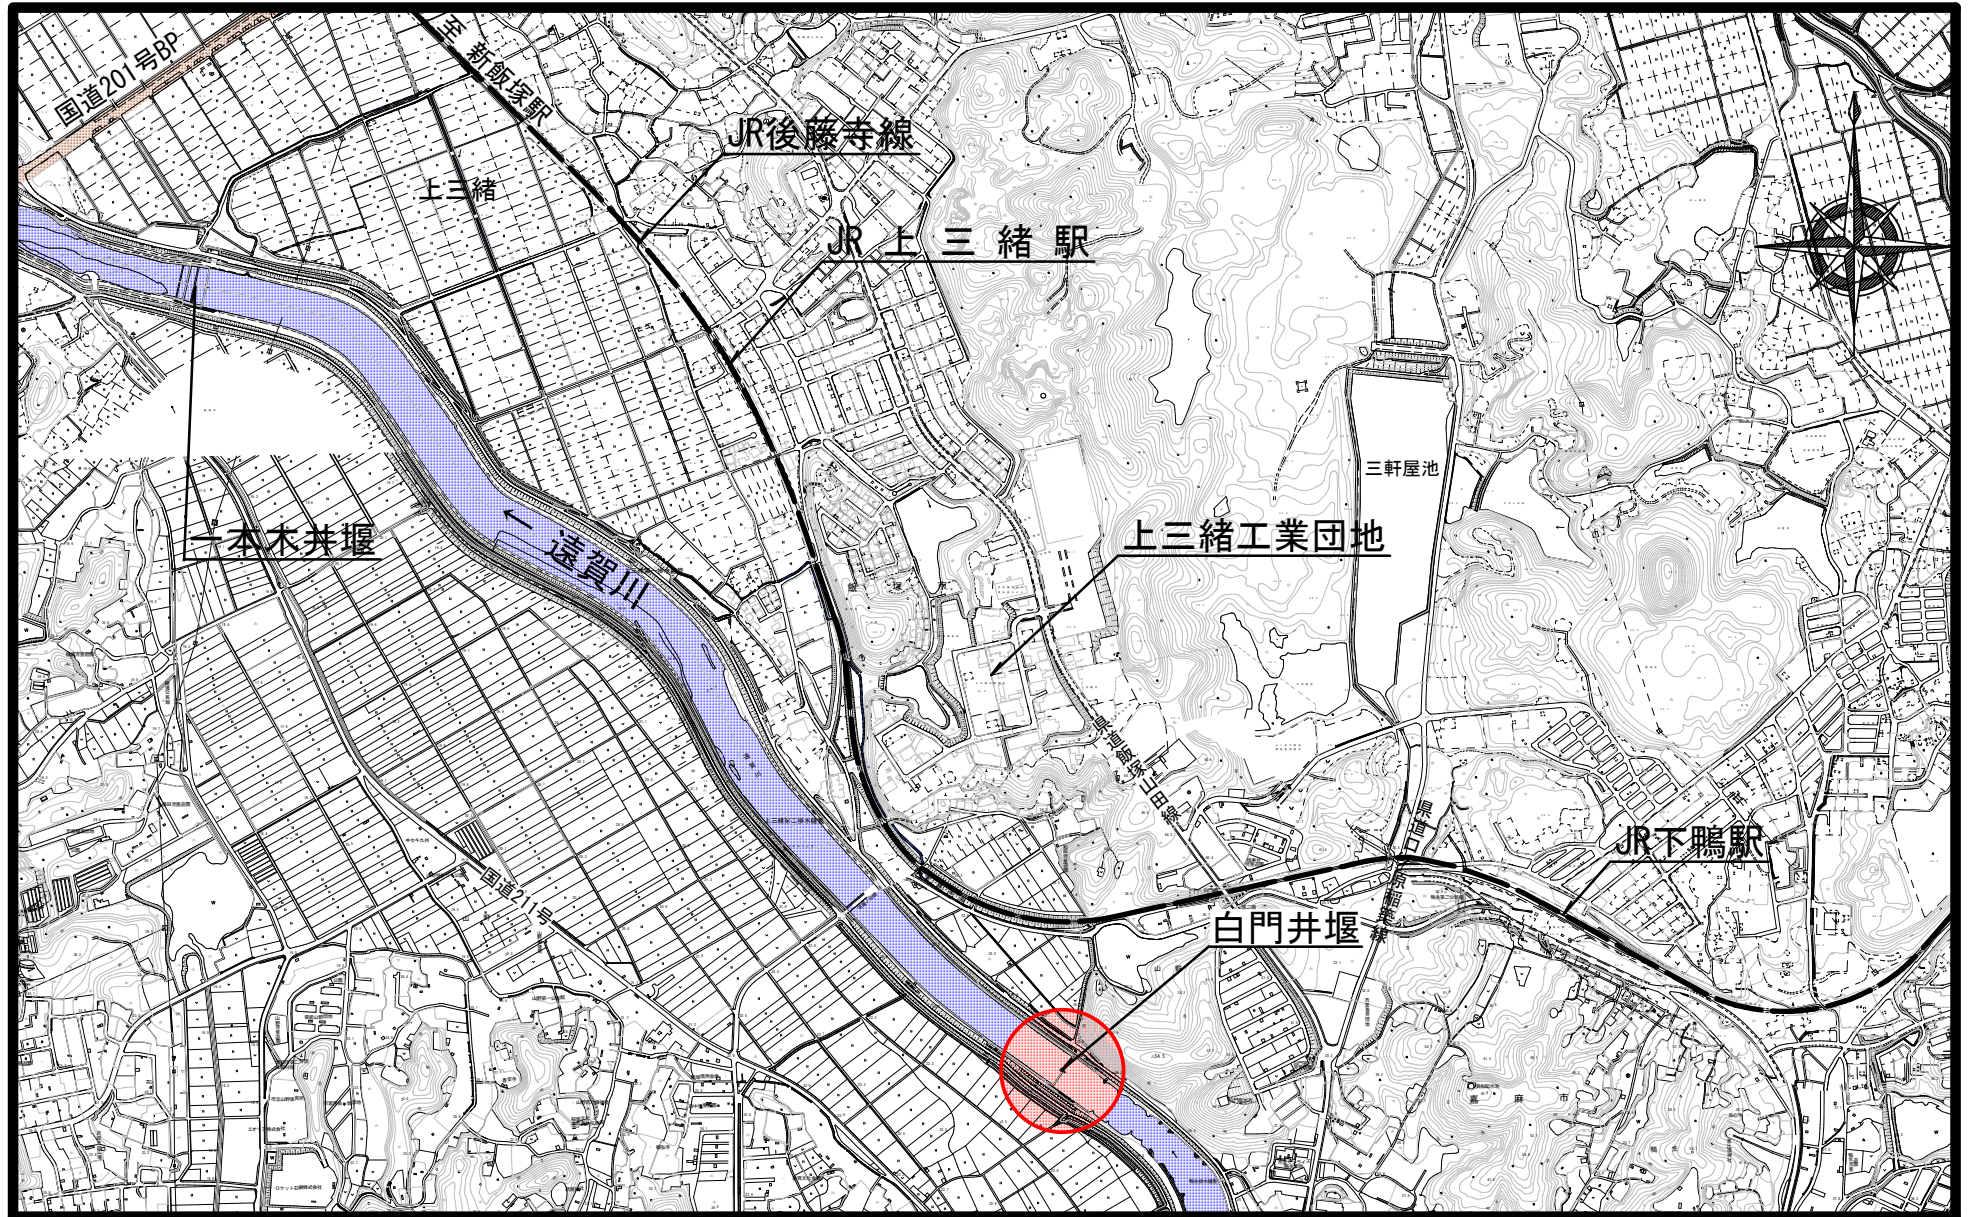




# 白門井堰（仮設工）改良工事 平面図 2

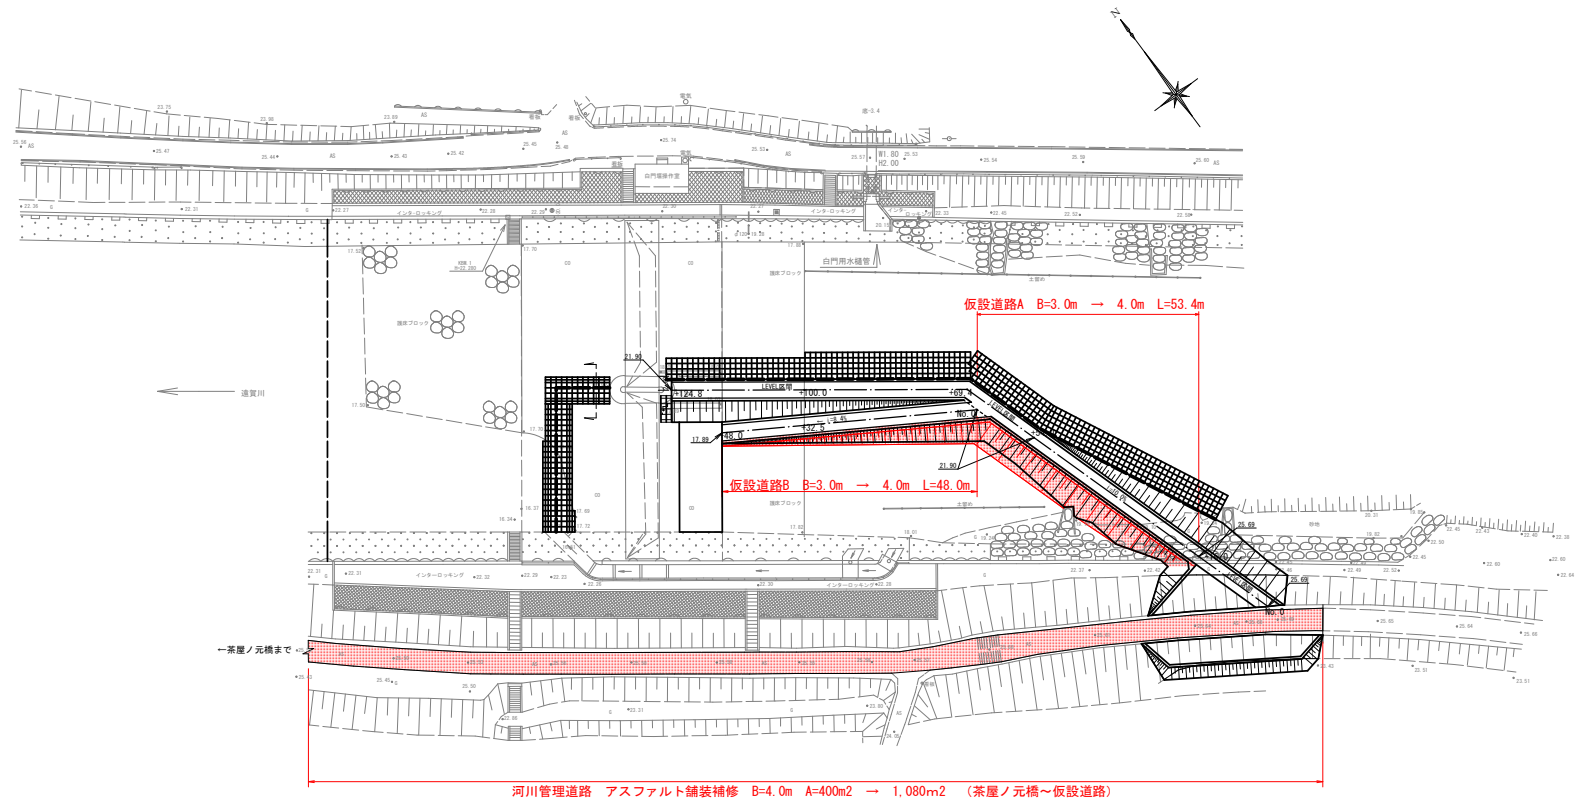

仮設道路B

No. 0+32.5'      No. 0+100.0'



仮設道路A

No. 0+54.0 - No. 0+69.4

